


CCC, Karlstad



Ställningsmontage påbörjad

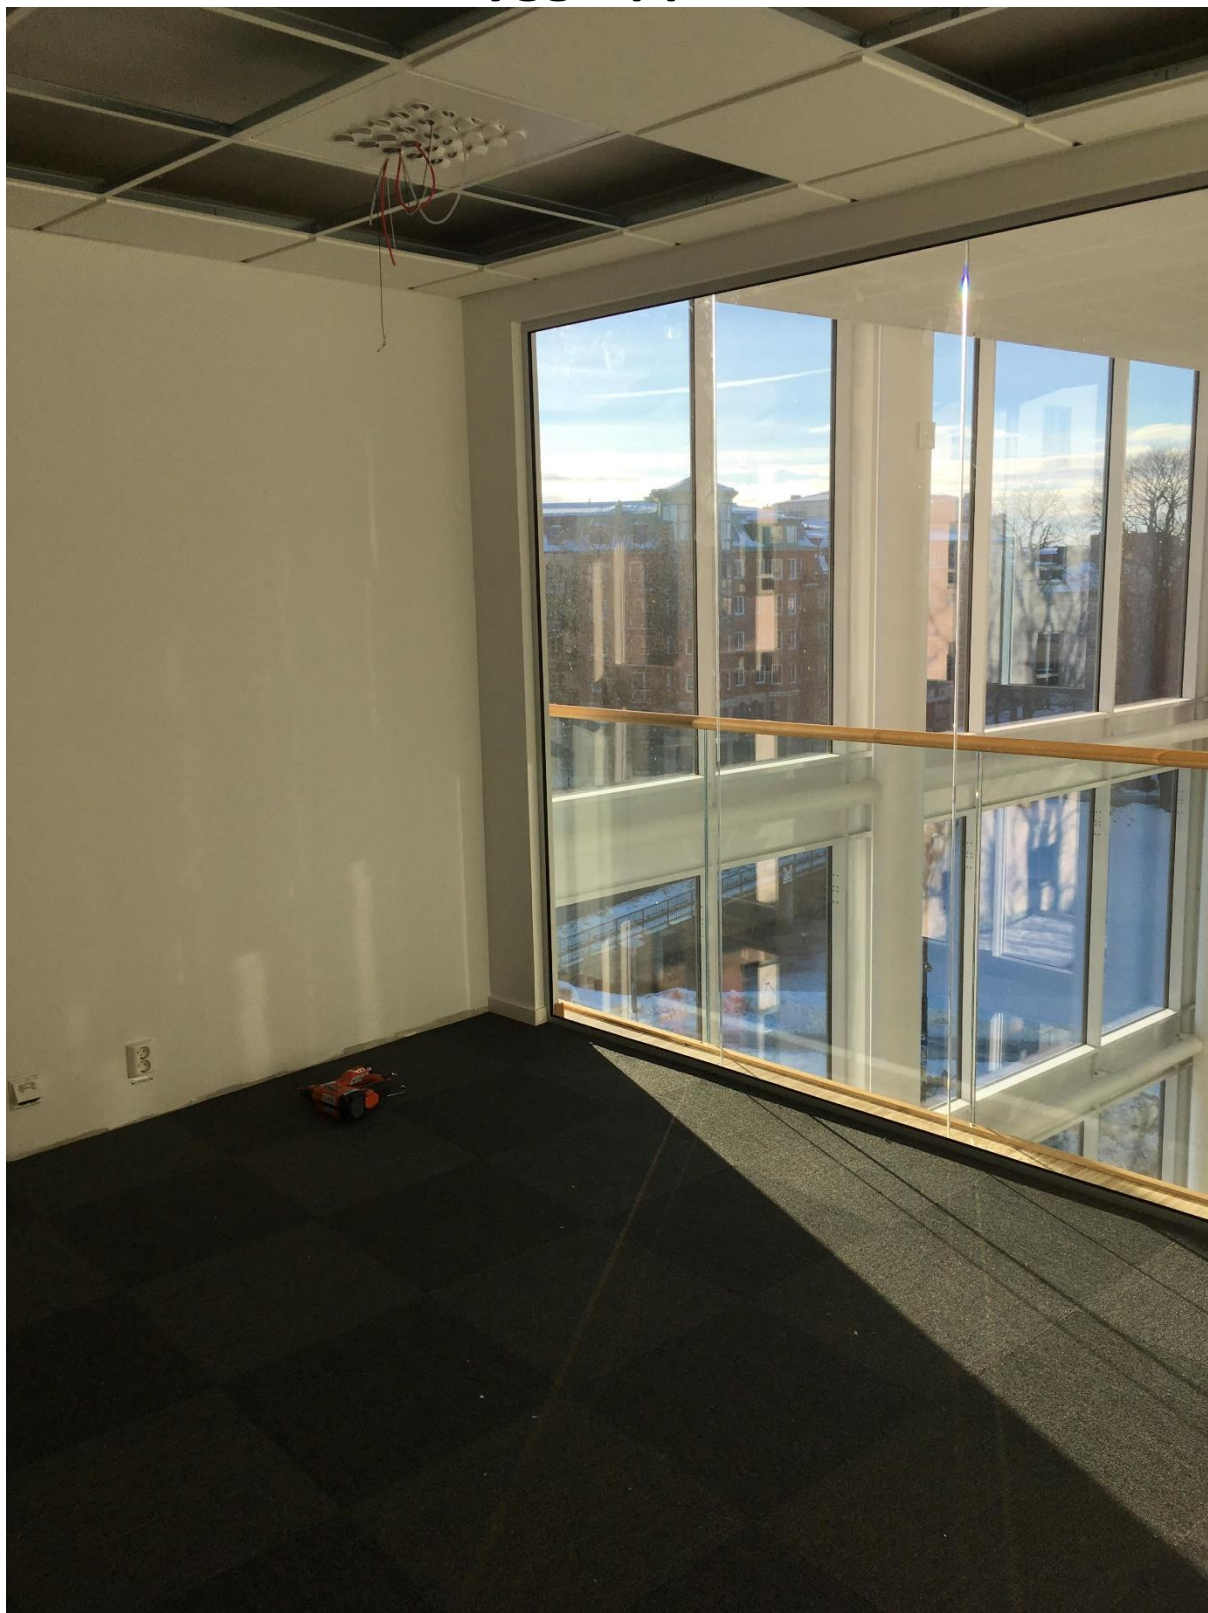

Textil samt glaspartier monterade



Kontoret på plan 5

Byggrapport

-CONSTO

Kommande veckor:

V.7

Tillbyggnation: Rivning befintliga väggar plan 6. Ställningsmontage

Ombyggnationen: Städ visit plan 5. Start rivning kök område 4 Konsumentverket.

V.8

Tillbyggnation: Uppsättning samt rivning innerväggar plan 6

Ombyggnationen: Uppsättning innerväggar

V.9

Tillbyggnation: Rivning utrymningstrapphus inför stommontage.

Ombyggnationen: Montage kök
